Projektreferenz

Projektbezeichnung:

Rückbau „RIAS“-Sendemast Britz

Deutschlandradio
Sender Britz
Britzer Damm 176
12347 Berlin

Leistungszeitraum:

Beginn:	26.03.2015
Ende:	27.08.2015

Auftraggeber:

Deutschlandradio
Funkhaus Berlin
Hans-Rosenthal-Platz
10825 Berlin

Ansprechpartner:

Herr Keuters
Tel.: 030 / 8503-7127
Fax: 030 / 8503-7109
E-Mail: martin.keuters@deutschlandradio.de

Auftragnehmer:

Bauleiter TVF:	Roland Domke
Baustellenleiter TVF:	Oliver Marks

Auftragswert (netto): **18.000,00 EUR**

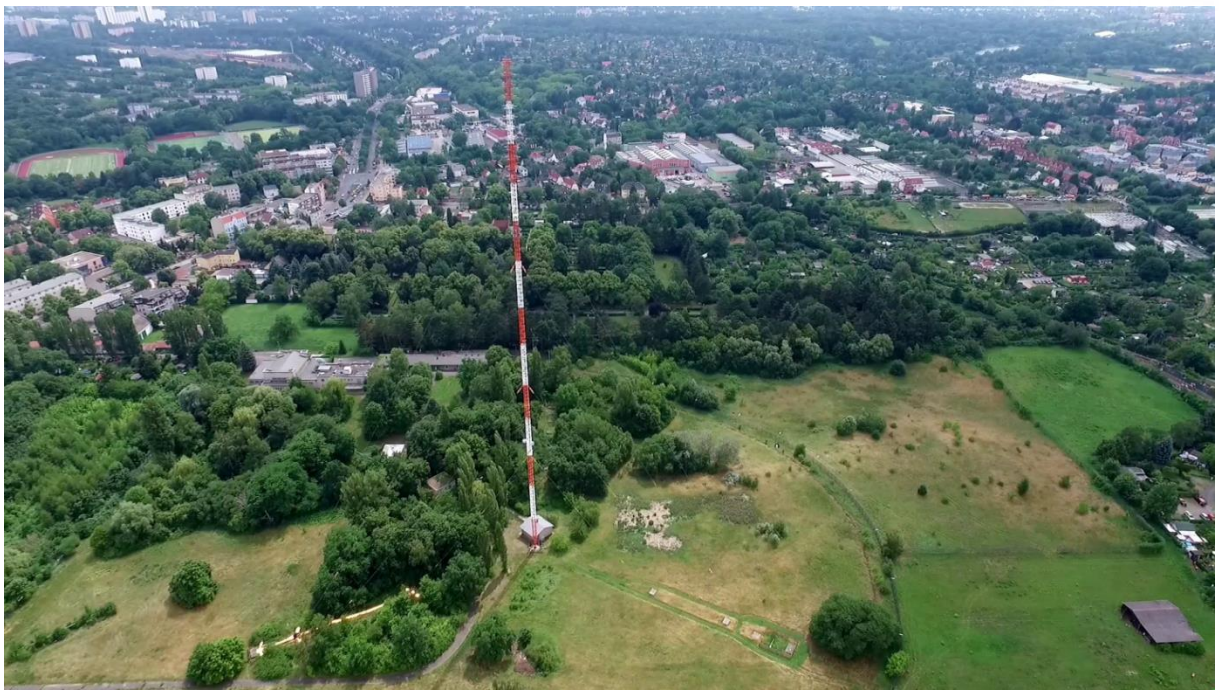

Leistungsumfang:

- Rückbau eines 160 m hohen Sendemastes (Stahlgitterkonstruktion ca. 55 t) einschließlich Fundamente:
  - Erarbeitung Abbruchtechnologie / Erstellung Sprengkonzept
  - Abbruch des Mastes durch Sprengung einschl. Überwachung durch Schwingungs- und Schalldruckmessung
  - Abfuhr und Verwertung der anfallenden Schrottes
  - Konventioneller Abbruch und Entsorgung der Fundamente
  - Geländeregulierung

Abbruch-, Rückbau- und Entsorgungsmassen:

Stahl	ca. 55 t
Beton	ca. 120 t
Razor 25	1 m
Sprengschnur 6g/m	60 m

Geräte- und Anlageneinsatz:

- Bagger CAT 329 mit Abbruchausrüstung
